

## Färdiganmälan av LTA-installation inför anslutning till Telge Nätts VA-system

Fastighetsbeteckning (för anslutning)	Gatuadress	Postadress
<b>Fastighetsägare</b>		
Personnr/orgnr: .....	Namn: .....	
Adress (om annan än ovan): .....	Postadress: .....	
Telefon: .....	Mobiltelefon: .....	
E-post: .....		
<b>Certifierad VVS-installatör</b>		
Namn: .....	Mobiltelefon: .....	
<b>Behörig elsinstallatör</b>		
Namn: .....	Mobiltelefon: .....	

### Kontrollera följande punkter innan i skickar in färdiganmälan:

Utfört	VVS-installation
	1. Anläggningen är utförd i enlighet med Telge Nätts/Skandinavisk Kommunaltekniks monteringsanvisningar "Montering och drift LPS2000E/Ex". <u>Eventuella avsteg från monteringsanvisningen ska godkännas av Telge Nätts personal.</u>
	2. Vattenledningen inom fastigheten är utförd med 32 mm ledning, PE DN32, tryckklass PN10 (blå märkning). Se bild 1 på sidan 3.
	3. Tryckavloppsledningen inom fastigheten är utförd med 40 mm ledning, PE DN40, tryckklass PN6,3 (orange märkning). Se bild 2 på sidan 3.
	4. Återfyllning till befintlig marknivå kring pumptanken är färdig.
	5. Täthetsprovning av nya och befintliga vatten- och avloppsledningar är utförd. Detta säkerställer att ledningarna och kopplingarna är täta och att inget ut- eller inläckage kan ske. Du kan välja att täthetsprova från mätarkonsolen ena koppling eller från rörkopplingarna som ska anslutas till Telge Nätts rörändar vid fastighetsgräns.
	6. Vattenmätarkonsol med 2 st ventiler samt passbit är monterad. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomlig för montage, byte och avläsning. Placeringen ska utformas enligt bild 3 på sidan 4.
	7. Vatten- och avloppsledningarna är renspolade (minskar risken för föroreningar i vattnet). Spolning och rengöring av avloppsledningen tar bort sand mm som ger driftproblem vid pumpen.
	8. Backventil är installerad vid anslutningspunkten i enlighet med bild 4 på sidan 4. Tillse att rören är helt inskjutna i botten, kopplingarna är dragna i botten och att pilen är monterad rakt uppåt i flödesriktningen, dvs från pumptanken ut mot gatan, och placerad så plant som möjligt. <u>Återfyllning kring backventilen kan göras först efter pumpinstallation! I samband med installationen inspekterar vi backventilen.</u>

**Telge Nät AB**  
Box 633, 151 27

Tel 08-550 221 00  
Fax 08-550 222 20

Org.nr: 556558-1757  
Säte i Södertälje

Besöksadress  
Storgatan 42,  
Södertälje

www.telge.se

<b>Utfört</b>	<b>VVS-installation</b>
	9. Marken inom en radie av 1 meter från LTA-enhetens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet eller byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket.
	10. Befintligt avloppssystem är överkopplat till pumptanken.
	11. Befintligt vattensystem (eget brunnsvatten eller motsvarande) är frånkopplat.
	12. Pumptanken är urpumpad, torr och rengjord (sand och grus i pumptanken skadar pumpen). Detta görs med fördel samma dag som Telge Nät installerar tanken.
	13. Fungerade tappkran (i kök, badrum, källare eller vattenutkastare) finns för påfyllning av pumptank vid montering av pumpen.
<b>Utfört</b>	<b>Elinstallation</b>
	14. Elinstallation är utförd av behörig elinstallatör. Kontaktuppgifter anges på förgående sida.
	15. Larmindikator ska vara placerad inhomhus på synlig plats (förslagsvis kök eller hall).
	16. Elinstallation ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata 10A, tröga säkringar. Säkringarna ska vara uppmärkta vid elcentralen.
<b>Utfört</b>	<b>Övrigt</b>
	17. Anläggningsavgiften för VA är betald. Telge Nät installerar inte pumpen innan betalning är gjord.
	18. Observera att om ni har fyllt upp marknivån kring pumptank kan marklov hos Samhällsbyggnadskontoret behövas.

**!** Kontrollera punkt 9-13 samt punkt 16 direkt före installationstillfället.

Jag intygar att anläggningen är fackmannamässigt utförd enligt ovanlämnade uppgifter och enligt Telge Nätets monteringsanvisningar. Jag är införstådd med att jag härmed tar på mig betalningsansvaret för en schablonavgift på 1 500 kr om min VA-anläggning trots denna färdiganmälan inte skulle vara färdig för inkoppling vid överenskommen tidpunkt. Vid eventuella fel och brister kan installationen bli försenad.

Ort och datum: .....

Fastighetsägare, underskrift: .....

Namnförtydligande: .....

**Posta eller mejla blanketten till:**

Telge Nät  
 Verksamhetsstöd  
 Box 633  
 151 27 Södertälje  
 eller  
 natmarknad@telge.se



**Bild 1**


PN 10  $\varnothing$ 32 mm, PE DN32



**Bild 2**

PN 6,3  $\varnothing$ 32 mm, PE DN40

Endast orangemärkt slang är godkänd på tryckavloppet. Helsvart eller blåmärkt slang är ej godkänd.

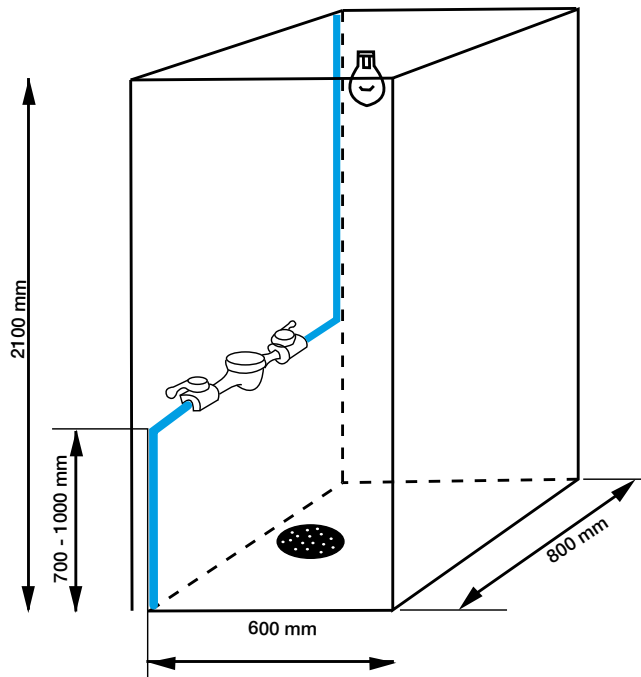

**Bild 3**

Vattenmätarens placering



**Bild 4**

Tillse att rören är helt inskjutna i botten, kopplingarna är dragna i botten och att pilen är monterad rakt uppåt i flödesriktningen, dvs från pumptanken ut mot gatan, och placerad så plant som möjligt.

